




MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



AFIR  
împreună creștem  
satul românesc



Reprezentant legal GAL Confluente Moldave  
Mihai Adrian Budau



# ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CONFLUENTE MOLDAVE"

Raport de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locala  
GAL Confluente Moldave

*Perioada evaluata 15 decembrie 2016 - 01 octombrie 2018*

*Proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul  
National de Dezvoltare Rurala (PNDR)*



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



## Cuprins

---

<b>Cap. I DEFINITII, ABREVIERI, REFERINTE NORMATIVE .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 DEFINITII .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 ABREVIERI.....</b>	<b>4</b>
<b>Cap. II EVALUAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA INFORMATII GENERALE .....</b>	<b>6</b>
<b>Cap. III ANALIZA PROGRESULUI PRIVIND DEPUNEREA SI CONTRACTAREA PROIECTELOR SI A PROGRESULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CONTRACTATE .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1 ANALIZA DOCUMENTARA.....</b>	<b>8</b>
<b>3.2 ANALIZA IN TEREN.....</b>	<b>16</b>
<b>3.3. CONCLUZII .....</b>	<b>32</b>



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



## Cap. I DEFINITII, ABREVIERI, REFERINTE NORMATIVE

### 1.1 DEFINITII

**Beneficiar** – organizatie publica sau privata care preia responsabilitatea realizarii unui proiect si pentru care a fost emisa o Decizie de finantare de catre AFIR/care a incheiat un Contract de finantare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

**Cerere de finantare** - document depus de catre un solicitant in vederea obtinerii sprijinului financiar nerambursabil;

**Cofinantare publica** – reprezinta fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - aceasta este asigurata prin contributia Uniunii Europene si a Guvernului României;

**Controlul implementarii strategiei** presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectarii planificarii legate de implementarea strategiei de dezvoltare locala;

**Evaluarea**- implica o decizie cu privire la interventii, in functie de rezultatele, de impactul si de nevoile pe care acestea urmaresc sa le satisfaca. Ea este un instrument sistematic, care ofera dovezi pentru luarea deciziilor si imbunatateste eficacitatea, utilitatea si eficienta implementarii strategiei;

**Grup de Actiune Locala (GAL)** – parteneriat public-privat alcatuit din reprezentanti ai sectoarelor public, privat si societatea civila;

**Indicator specific** inseamna rezultatul la care contribuie o prioritate de investitii sau o prioritate a Uniunii intr-un context local specific prin actiuni sau masuri luate in cadrul unei astfel de prioritati;

**Indicatorii financiari (input)** – se refera la bugetul alocat pe fiecare nivel masura. Acesti indicatori sunt utilizati pentru monitorizarea progresului Strategiei in functie de angajamentele si platile efectuate din fondurile disponibile pentru fiecare masura in relatie cu costurile eligibile;

**Indicatorii de realizare (output)** se refera la activitatea efectuata. Acestia sunt masurati in unitati fizice sau monetare (numarul de ferme sustinute financiar, lungimea drumului construit).

**Indicatorii aditionali** – se refera la stabilirea unor indicatori suplimentari in cadrul Strategiei.

**Indicatorii de rezultat** se refera la efectul direct si imediat al unui program. Ei furnizeaza informatii asupra schimbarilor, de exemplu, mediul, capacitatea sau performanta beneficiarilor directi. Acest tip de indicatori pot fi de natura fizica (reducerea timpului zilnic, numarul instruirilor succesive) sau financiara (resursele din sectorul privat, scaderea costului de transport);

**Indicatorii de impact** se refera la consecventa programului vizavi de efectul imediat asupra beneficiarilor directi. Se pot defini doua concepte ale impactului. Impacturile specifice sunt acele efecte aparute dupa un anumit interval de timp dar care sunt, totusi in legatura directa cu actiunile luate. Impacturile globale sunt efecte de lunga durata care afecteaza un segment larg de populatie. Masurarea acestui tip de impact este complexa si poate cauza clar relatii adesea dificil de stabilit.

**LEADER** – Masura din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunitatilor rurale ca urmare a implementarii strategiilor elaborate de catre GAL. Provine din limba franceza „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legaturi intre Actiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;

**Masura** – set de operatiuni care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala.;



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



**Monitorizarea strategiei** - reprezintă activitatea sistematică prin care se pun la dispoziția factorilor implicați (Autoritatea de Management, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor rurale) informații cu privire la progresul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Confluente Moldave;

**Proiect** – orice operațiune întreprinsă de un beneficiar al măsurilor incluse în Strategia de dezvoltare locală 2014-2020 a Asociației GAL Confluente Moldave finanțate din FEADR.

**Potential beneficiar (solicitant)** – reprezintă o persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse prin FEADR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanțare cu AFIR

**Proiect eligibil** – PROIECT care îndeplinește criteriile și condițiile precizate în Ghidul Solicitantului, pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea finanțării.

**Rata de eroare a proiectelor** reprezintă raportul dintre proiectele declarate eligibile la AFIR și proiectele selectate la GAL.

**Reprezentantul legal** – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului;

**Sesiune de depunere** reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia Asociația GAL Confluente Moldave poate primi proiecte din partea potențialilor beneficiari ai proiectului.

**Strategie de Dezvoltare Locală** - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER;

**Valoare eligibilă a proiectului** – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de cofinanțare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

**Valoarea neeligibilă a proiectului** – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul ghid și, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanțare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral, din punct de vedere financiar de către beneficiarul proiectului.

**Valoare totală a proiectului** – reprezintă suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru investiții/servicii.

## 1.2 ABREVIERI

**MADR** – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

**PNDR** – Programul Național de Dezvoltare Rurală

**AFIR** – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

**OJFIR** – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structura organizatorică la nivel județean a AFIR

**CRFIR** – Centrul Regional Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

**SL** – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



**CDRJ**- Compartiment de Dezvoltare Rurala Judetean

**APL** -Administratie Publica Locala

**SDL** – Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei Confluente Moldave

**GAL** - Asociatia GAL Confluente Moldave

### 1.3 REFERINTE NORMATIVE SI REGLEMENTARI TEHNICE

- **Regulamentul (UE) nr. 1305/2013** din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Regulamentul (UE) NR. 1303/2013** al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- **Hotarârea Guvernului nr. 226/2015** privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2015** privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii;
- **Hotarâre nr. 640/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii.
- Ghidul de implementare Sub-masura 19.4 „ Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare,, versiunea 04;
- Manual de procedura pentru implementarea Masurii 19,, Sprijin pentru dezvoltare locala LEADER,, Sub- masura 19.4 „ Sprijin pentru cheltuieli de functionare si Animare,, versiunea 04;
- Ghidul de implementare Sub-masura 19.2 „ Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala, versiunea 03;
- Manual de Procedura de procedura pentru implementarea Masurii 19,, Sprijin pentru dezvoltare locala LEADER,, Sub- masura 19.2 „ Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala,, versiunea 05;
- Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL versiunea 04, aprobat prin Ordinul MADR nr.1206/25.06.2018;



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- Strategia de Dezvoltare Locala pentru perioada 2014-2020 a Asociatiei GAL Confluente Moldave
- Ghid Operational privind Evaluarea Implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locala, iulie 2018

## Cap. II EVALUAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA INFORMATII GENERALE

Conform art. 34, aliniatul 3 litera g) din Reg. (UE) nr. 1303/2013, GAL -urile au ca atributii si activitati specifice de evaluare in legatura cu Strategia de dezvoltare locala, activitate prevazuta si in cadrul SDL GAL Confluente Moldave in cap. IX.

Evaluarea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala are ca principal scop analiza eficacitatii (masura in care au fost indeplinite obiectivele stabilite), eficientei (relatia optima intre resursele folosite si rezultatele obtinute), relevantei (masura in care obiectivele programate sunt in conformitate cu nevoile, problemele si diferite alte aspecte intalnite in implementarea SDL) si a impactului socio-economic generat de interventiile SDL asupra dezvoltarii durabile si echilibrate a spatiului rural al GAL Confluente Moldave.

Prezenta evaluare are ca perioada de referinta perioada cuprinsa intre semnarea contractului de finantare aferent sub-masurii 19.4 - 15 decembrie 2016 si data de 01 octombrie 2018, si se bazeaza pe datele privind monitorizarea implementarii SDL, corelat cu gradul de implementare a masurilor prevazute in strategie.

GAL Confluente Moldave are in structura sa 7 APL uri si 39 entitati private dintre care 33 agenti economici si 6 asociatii si fundatii, ponderea fiind de 84,78% entitati private si 15,22% administratii publice locale.

Activitatile de animare a teritoriului – promovare si informare derulate au constat in principal în:

- Organizarea de campanii de promovare apeluri de selectie in toate cele 7 UAT-uri membre,
- Publicare comunicate de presa (pentru publicitatea apelurilor de selectie),
- Organizarea de sarbatori locale, in cadrul carora a fost realizata promovarea GAL Confluente Moldave,
- Au fost distribuite materiale de promovare personalizate: flyere, pliante si brosururi,
- Persoanele interesate au primit informatii punctuale despre posibilitatile de finantare prin intermediul GAL Confluente Moldave.

Procesul de evaluare a parcurs urmatoarele etape :

- Elaborarea unui Plan de evaluare,
- Constituirea unui Comitet de coordonare a evaluarii,
- Elaborarea design-ului evaluarii (alegerea metodelor si formularea intrebarilor de evaluare),
- Derularea activitatilor de evaluare,
- Elaborarea Raportului si Transmiterea raportului de evaluare factorilor interesați,
- Publicarea acestuia pe site-ul GAL.



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Comitetul de coordonare a evaluării la nivelul GAL Confluente Moldave este format din:

**Mihai-Adrian Budau – Presedinte Consiliu Director GAL Confluente Moldave**

**Gabriela Dospinescu – Expert tehnic**

**Maria – Georgeta Esanu -Expert tehnic**

Ca responsabil de evaluare a fost nominalizat Ciprian – Octavian Pisteș – Manager GAL

**Plan de evaluare propus**

<i>Etapa</i>	<i>Activitate</i>	<i>De la</i>	<i>Pana la</i>
<i>Elaborarea design-ului evaluării</i>	<i>Stabilirea metodelor și a întrebărilor</i>	<i>01.10.2018</i>	<i>01.11.2018</i>
<i>Derularea activităților de evaluare</i>	<i>Obținerea răspunsurilor la întrebări</i>	<i>01.11.2018</i>	<i>15.11.2018</i>
	<i>Analiza răspunsurilor la întrebări</i>	<i>15.11.2018</i>	<i>29.11.2018</i>
<i>Elaborarea Raportului de autoevaluare</i>	<i>Prelucrarea tuturor informațiilor și elaborarea Raportului de autoevaluare</i>	<i>29.11.2018</i>	<i>28.12.2018</i>
<i>Transmiterea raportului de evaluare factorilor interesați și publicarea acestuia pe site-ul GAL</i>	<i>Transmiterea Raportului de autoevaluare către LEADER și publicarea acestuia pe site-ul GAL</i>	<i>31.01.2018</i>	<i>31.01.2019<sup>1</sup></i>

<sup>1</sup> Conform Notei nr. 25705525/01.2019 a AM PNDR această etapă a fost prelungită până la data de 28.02.2019.

**Având în vedere că la nivelul GAL Confluente Moldave nu există până în prezent nici un proiect finalizat, evaluarea s-a concentrat pe analiza următoarelor aspecte:**

- Analiza progresului privind depunerea și contractarea proiectelor. Factori care influențează acest progres, măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea ritmului de contractare.
- Analiza progresului implementării proiectelor contractate. Aspecte tipice ale implementării proiectelor; factori tipici care influențează implementarea proiectelor; analiza măsurii în care progresul este adecvat față de planul de implementare al proiectelor; analiza capacității beneficiarilor proiectelor de a identifica și aplica măsuri de corectare atunci când este necesar; măsura în care progresul înregistrat în implementarea proiectelor poate duce la atingerea rezultatelor așteptate; măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea calității și eficienței implementării proiectelor.
- Lecții care pot fi desprinse, aplicabile pentru viitoarea perioadă de programare, respectiv viitorul exercițiu financiar.



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



## Cap. III ANALIZA PROGRESULUI PRIVIND DEPUNEREA SI CONTRACTAREA PROIECTELOR SI A PROGRESULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CONTRACTATE

### 3.1 ANALIZA DOCUMENTARA

Analiza documentara a presupus studiul tuturor documentelor aferente celor 8 masuri cuprinse in SDL si a avut ca scop analiza gradului de implementare a SDL prin prisma indicatorilor de monitorizare pentru fiecare masura (prevazuti in Fisele masurilor din SDL), precum si analiza urmatoilor indicatori sintetici:

- Gradul de absorbtie al fondurilor alocate pe masuri (%)
- Gradul de contractare a proiectelor selectate (%)

Prin Strategia de dezvoltare locala a GAL Confluente Moldave au fost identificate un numar de opt masuri pentru sprijinirea dezvoltarii comunitatilor locale din cele sapte localitati componente ale GAL Confluente Moldave, pentru care in continuare se face o analiza privind progresul in depunerea si contractarea acestora , precum si in implementarea proiectelor contractate.

#### Masura 1/1A”Sprijin pentru infiintarea si promovarea formelor asociative in GAL ”Confluente Moldave”

Tip de indicator	Indicator conform Fisei masurii	Tinta prin SDL	Inregistrat	Grad de indeplinire
		A	B	$C=B/A*100$
Realizare	Numarul total de operatiuni de cooperare sprijinite in cadrul masurii de cooperare	Min 1	NA	NA
Rezultat	Cheltuieli publice totale Numar de locuri de munca	56.745 Euro	NA	NA
		Min.1		
Impact	Creare locuri munca create	Min.1	NA	NA

NA – pentru acesti indicatori de realizare, rezultat si impact nu se poate calcula inca gradul de realizare pentru ca masura nu a fost inca lansata.





MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



## Masura 2/2A "Investitii in cresterea productivitatii si competitivitatii in GAL "Confluente Moldave"

Tip de indicator	Indicator conform Fisei masurii	Tinta prin SDL	Inregistrat	Grad de indeplinire
		A	B	$C=B/A*100$
Realizare	Numarul de exploataii agricole/ beneficiari sprijiniti	Minim 3	2	66,6%
Rezultat	Cheltuieli publice totale	453.961 Euro	78.250 Euro	17,2%
	Numar de locuri de munca create	Min. 3	1	33,3%
Impact	Crearea de locuri de munca	Minim 3	1	33,3%

NA - pentru acesti indicatori de rezultat si impact nu se poate calcula inca gradul de realizare pentru ca proiectele nu a fost inca implementate

Valoarea inregistrata a indicatorului de rezultat are la baza Raportul de selectie aferent masurii si indicatorii propusi prin cele 2 proiecte selectate.

Pentru aceasta Masura, prioritară pentru GAL atât ca fond disponibil cât și ca număr de potențiali beneficiari, au fost lansate 2 apeluri de selectie:

- primul apel de selectie a fost lansat in data de 29.11.2017, fiind prelungit până pe data de 21.03.2018. In cadrul acestui prim apel de selectie au fost depuse un număr de 3 proiecte cu o valoare totală de 117.715 euro. Toate cele 3 proiecte au fost declarate eligibile la nivelul GAL "Confluente Moldave" însă, pe parcursul evaluării proiectelor la nivelul OJFIR Bacău, un proiect a fost retras de către deponent. Celelalte două proiecte au fost declarate eligibile la nivelul OJFIR Bacău, contractele de finanțare fiind deja semnate de către beneficiari.
- al doilea apel de selectie, cu un fond disponibil de 336.246 euro a fost lansat in data de 23.07.2018, perioada de depunere fiind prelungită până pe 05.11.2018.

La nivelul acestei masuri un proiect a fost deja finalizat realizandu-se plata la nivelul beneficiarului final, precum si infiintarea de catre acesta a unui loc de munca.



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



### Măsura 3/3A "Sprijin pentru atestarea produselor de calitate cu reprezentativitate pentru mediul rural tradițional din GAL "Confluente Moldave"

Indicatori conform măsurii

Tip de indicator	Indicator conform Fisei măsurii	Tinta prin SDL	Inregistrat	Grad de indeplinire
		A	B	$C=B/A*100$
Realizare	Numarul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	2	NA	NA
Rezultat	Cheltuieli publice totale	18.000 Euro	NA	NA
	Numarul de dosare de candidatură depuse	Min.1	NA	NA
	Numar de atestate obtinute	Min.1	NA	NA
	Numar de locuri de munca create	Min. 3	NA	NA
Impact	Creare de locuri de munca	Min.3	NA	NA

NA – pentru acești indicatori de realizare, rezultat și impact nu se poate calcula încă gradul de realizare pentru că măsura nu a fost încă lansată.

### Măsura 4/6B "Investiții pentru dezvoltarea spațiului rural din teritoriul GAL "Confluente Moldave"

Tip de indicator	Indicator conform Fisei măsurii	Tinta prin SDL	Inregistrat	Grad de indeplinire
		A	B	$C=B/A*100$
Rezultat	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită	Populația din teritoriul – 37.461 locuitori	NA	NA



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



	Cheltuieli publice totale	259.407 Euro	256.328 Euro	98,8%
	Numar de locuri de munca create	Min. 3	NA	NA
Impact	Crearea de locuri de munca	Minim 3	NA	NA

NA - pentru acesti indicatori de rezultat/impact nu se poate calcula inca gradul de realizare pentru ca proiectele nu a fost inca implementate

Valoarea inregistrata a idicatorului de rezultat are la baza Rapoartele de selectie aferente masurii si indicatorii propusi prin cele 7 proiecte selectate.

Pentru aceasta masura s-au lansat 2 apeluri de selectie.dupa cum urmeaza:

- primul apel de selectie a fost lansat in data de 30.08.2017 cu perioada de depunere a proiectelor cuprinsa intre 30.08.2017 și 16.10.2017, prelungita pâna pe 15.11.2017. S-au depus un numar de 7 proiecte, toate provenind de la UAT-urile partenere ale GAL, valoarea totala a proiectelor fiind de 253.952 euro. Pe parcursul evaluarii cererilor de finantare efectuata de catre expertii GAL, o Unitate Administrativ-Teritoriala a decis retragerea proiectului depus. Cele 6 proiecte ramase au fost declarate eligibile atât de catre GAL cât și de catre OJFIR Bacau, toate contractele de finantare fiind deja semnate. Din cele sase proiecte 5 proiecte vizau imbunatatirea serviciului de iluminat public iar al 6-alea achizitionarea unui buldoexcavator.
- al doilea apel de selectie a fost lansat in data de 19.02.2018, data limita de depunere fiind 21.03.2018, cu un fond disponibil de 42.455 euro. A fost depus un singur proiect, cu o valoare de 39.466 euro, de catre acelasi UAT care a decis retragerea proiectului depus in cadrul primului apel de selectie. Proiectul depus a fost declarant eligibil de catre GAL, respective CRFIR, in momentul raportarii fiind in curs de contractare.

**Masura 5/6A "Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole in GAL "Confluente Moldave"**

Tip de indicator	Indicator conform Fisei masurii	Tinta prin SDL	Inregistrat	Grad de indeplinire
		A	B	C=B/A*100
Realizare	Numarul de beneficiari sprijiniti	Minim 4	3	66,6%



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Rezultat	Cheltuieli publice totale	453.961 Euro	179.664 Euro	39,5%
	Total investitii	567.451,25 Euro	208.457 Euro	36,7%
	Numar de locuri de munca create	Min. 4	NA	NA
Impact	Crearea de locuri de munca	Minim 4	NA	NA

NA - pentru acesti indicatori de rezultat/ impact nu se poate calcula inca gradul de realizare pentru ca proiectele nu a fost inca implementate

Valoarea inregistrata a idicatorilor de realizare si rezultat are la baza Raportul de selectie aferent masurii si indicatorii propusi prin cele 3 proiecte selectate.

Pe aceasta masura au fost lansate doua apeluri de selectie dupa cum urmeaza:

- primul apel de selectie a fost lansat in perioada 31.10.2017-15.03.2018 (inclusiv 2 prelungiri succesive), cu un disponibil de 453.961 euro. Au fost depuse 6 proiecte cu o valoare de 298.842 euro, un proiect fiind retras de catre deponent in perioada de evaluare la nivelul GAL. Din cele cinci proiecte ramase toate au fost declarate eligibile de catre GAL. La nivelul OJFIR Bacau 3 proiecte au fost declarate eligibile, un proiect a fost retras de catre deponent, un altul a fost declarant neeligibil de catre OJFIR Bacau.
- al doilea apel de selectie a fost lansat pe 23.07.2018, data limita de depunere a proiectelor fiind prelungita pâna pe 26.11.2018, fondul disponibil pentru acest al doilea apel fiind de 195.079 euro.

**Masura 6/6B "Investitii in infrastructura sociala pentru grupuri vulnerabile din GAL "Confluente Moldave"**

Tip de indicator	Indicator conform Fisei masurii	Tinta prin SDL	Inregistrat	Grad de indeplinire
		A	B	C=B/A*100
Realizare	Numarul de beneficiari sprijiniti	Minim 1	NA	NA
Rezultat	Cheltuieli publice totale	136.188 Euro	NA	NA
	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri	Populatia aparținând grupurilor vulnerabile	NA	NA



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



	Numar de locuri de munca create	Min. 1	NA	NA
Impact	Crearea de locuri de munca	Min.1	NA	NA

NA – pentru acesti indicatori de realizare, rezultat si impact nu se poate calcula inca gradul de realizare pentru ca masura nu a fost inca lansata.

**Masura 7/6C "Investitii in infrastructura de banda larga in GAL "Confluente Moldave"**

Tip de indicator	Indicator conform Fisei masurii	Tinta prin SDL	Inregistrat	Grad de indeplinire
		A	B	C=B/A*100
Rezultat	Cheltuieli publice totale	35.668 Euro	NA	NA
	Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC	3% din populatia aflata in zonele albe	NA	NA
	Numar locuri munca create	Min. 1	NA	NA
Impact	Crearea de locuri de munca	min. 1 loc	NA	NA

A – pentru acesti indicatori de rezultat si impact nu se poate calcula inca gradul de realizare pentru ca masura nu a fost inca lansata.

**Masura 8/6B "Investitii pentru integrarea minoritatilor locale, in special minoritatea roma si a grupurilor vulnerabile din GAL "Confluente Moldave"**

Tip de indicator	Indicator conform Fisei masurii	Tinta prin SDL	Inregistrat	Grad de indeplinire
		A	B	C=B/A*100
Realizare	Numarul de beneficiari sprijiniti	Minim 1	NA	NA
Rezultat	Cheltuieli publice totale	24.319 Euro	NA	NA
	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructura imbunatatita	Minoritatea roma, alaturi de alte minoritati de pe teritoriul GAL, grupuri vulnerabile, fermierii din teritoriul GAL	NA	NA



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



	Numar de locuri de munca create	Min. 1	NA	NA
Impact	Crearea de locuri de munca	Min.1	NA	NA

NA – pentru acesti indicatori de realizare, rezultat si impact nu se poate calcula inca gradul de realizare pentru ca masura nu a fost inca lansata.

*In continuare este prezentata situatia centralizatoare a proiectelor depuse si evaluate la nivelul GAL Confluente Moldave pe cele trei masuri M2, M4 si M5:*



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Din analiza realizata pentru cele 3 masuri lansate (M2, M4, M5) se constata urmatoarele:

<i>Masura</i>	<i>Beneficiar</i>	<i>Public/ Privat</i>	<i>Valoarea totala a proiectului (euro)</i>	<i>Valoarea eligibila a proiectului (euro)</i>	<i>Valoarea nerambursabila a proiectului (euro)</i>	<i>Stadiul</i>
<b>M2/2A</b>	ROLEX SRL	Privat	211.700	80.000	40.000	<i>Contractat</i>
	CROPLAND SRL	Privat	91.035	76.500	38.250	<i>Contractat</i>
	NOVA CEREALIS SRL	Privat	93.927	78.930	39.465	<i>Neeligibil</i>
<b>TOTAL</b>					<b>78.250</b>	
<b>M5/6A</b>	EMOBILE SRL	Privat	128.425	77.769	69.992	<i>Notificat CRFIR</i>
	SCORPION SRL	Privat	63.047	52.981	39.736	<i>Notificat CRFIR</i>
	ALFA ALTUS SRL	Privat	90.428	53.333	40.000	<i>Neeligibil</i>
	BIOCARB ENERGY SRL	Privat	83.419	77.707	69.936	<i>Notificat CRFIR</i>
	METAL MIRIAL SRL	Privat	43.576	43.576	39.218	<i>Retras</i>
	CWD SPECTRUM CONCEPT SRL	Privat	53.280	53.280	39.960	<i>Retras</i>
<b>TOTAL</b>					<b>179.664</b>	
<b>M4/6B</b>	Comuna NICOLAE BALCESCU	Public	48.827	39.672	39.672	<i>Contractat</i>
	Comuna CLEJA	Public	51.739	39.466	39.466	<i>Notificat CRFIR</i>
	Comuna FARAOANI	Public	44.003	36.750	36.750	<i>Contractat</i>
	Comuna LIVEZI	Public	44.003	36.750	36.750	<i>Contractat</i>
	Comuna BERZUNTI	Public	36.247	27.618	27.618	<i>Contractat</i>
	Comuna LETEA	Public	47.317	39.072	39.072	<i>Contractat</i>
	Comuna BUHOCI	Public	87.952	37.000	37.000	<i>Contractat</i>
<b>TOTAL</b>					<b>256.328</b>	



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- s-au depus un număr de 16 proiecte, cu o valoare totală nerambursabilă de 672.885 euro, au fost retrase 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 79.465 euro (1 la nivelul GAL, 1 la nivel OJFIR) și un proiect în valoare nerambursabilă de 40.000 euro a fost declarat neeligibil la nivel de CRFIR. ***Cele 12 proiecte eligibile selectate au o valoare totală nerambursabilă de 514.242 euro.***
- ***au fost contractate 8 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 295.132 euro*** – șase pe măsura 4/6B "Investiții pentru dezvoltarea spațiului rural din teritoriul GAL "Confluente Moldave" și două pe măsura 2/2A "Investiții în creșterea productivității și competitivității în GAL "Confluente Moldave", dintre care unul a fost finalizat.

***Ca și concluzie până la momentul realizării evaluării SDL – 1 octombrie 2018 - gradul de absorbție este de 28,99%, calculate ca raport între valoarea publică a proiectelor selectate și valoarea totală a fondurilor alocate pentru măsuri de 1.773.322 euro, iar gradul de contractare este de 57,38% - calculate ca raport dintre valoarea publică a proiectelor contractate raportat la valoarea publică a proiectelor selectate.***

În afara acestei analize a datelor administrative și a studierii documentelor aferente măsurilor cuprinse în SDL autoevaluarea a cuprins și aplicarea de chestionare pentru publicul larg și pentru APL-uri, în vederea evidentierii unor aspecte legate de eficiența și eficacitatea implementării SDL.

În momentul elaborării SDL au fost identificați factorii interesați care să participe la elaborarea acestuia prin metoda specifică LEADER – de jos în sus, dar în același timp să constituie zona principală de direcționare a resurselor financiare existente în măsurile și în portofoliul de proiecte aferent SDL. Analizând din punctul de vedere al criteriului de reprezentativitate structura parteneriatului releva faptul că 84,78% se constituie din mediul privat – structuri asociative și mediul de afaceri și 15,22% din APL-uri, care reprezintă interesele administrației publice locale, dar care se prezuma că sunt exponenții intereselor comunității. Ca atare în structura SDL cea mai mare parte a măsurilor, ca și a fondurilor disponibile se adresează mediului privat.

### **3.2 ANALIZA ÎN TEREN**

Analiza în teren a fost realizată printr-un sondaj de opinie realizat pe baza chestionarelor aplicate locuitorilor din cele 7 UAT-uri componente GAL Confluente Moldave, precum și reprezentanților APL-urilor. Această analiză a fost de natură să analizeze pe de o parte impactul pe care l-a avut până acum SDL-ul la nivelul comunităților locale și a administrațiilor publice locale, iar pe de altă parte să identifice o serie de lecții care pot fi desprinse, aplicabile pentru viitoarea perioadă de programare respectiv viitorul exercițiu financiar, privind domeniile prioritare, dezvoltarea capacității de absorbție a resurselor financiare existente în GAL, furnizarea informațiilor necesare tuturor factorilor interesați, generarea unor modele de bună practică puse la îndemână tuturor celor care doresc să acceseze măsurile specifice GAL Confluente Moldave.





MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE




### 3.2.1 - Analiza chestionare adresate locuitorilor unitatilor administrative -teritoriale din GAL Confluente Moldave

Prezentam in continuare intrebarile care au facut obiectul chestionarului pentru locuitorii celor 7 Unitati administrativ teritoriale - Berzunți, Buhoci, Cleja, Faraoani, Letea Veche, Livezi, Nicolae Bălcescu, precum si concluziile care au reiesit in urma analizei celor 77 de chestionare. Precizam ca nu a existat o anumita segmentare a grupului tinta acesta fiind constituit dintr-un numar variabil de la o localitate la alta, de locuitori ai comunelor care lucreaza in administratie, agricultura, comert sau alte domenii de activitate.

#### 1 - Cum ati aflat de GAL Confluente Moldave precum si de fondurile europene care se pot obtine prin GAL?


<i>Varianta raspuns/ participanti care nu au raspuns</i>	<i>Nr. respondenti</i>
Nu au raspuns la aceasta intrebare	3
Am beneficiat de materiale informative distribuite de GAL Confluente Moldave	13
Am participat la intalnirile / evenimentele organizate de GAL Confluente Moldave	20
Am beneficiat de materiale informative distribuite de GAL Confluente Moldave si Am participat la intalnirile / evenimentele organizate de GAL Confluente Moldave	14
Altele – internet, mass media, administratia locala, cunostinte	17
Am beneficiat de materiale informative distribuite de GAL Confluente Moldave, Am participat la intalnirile / evenimentele organizate de GAL Confluente Moldave si Altele	10



Din analiza chestionarelor a reiesit ca 61% dintre respondenti au beneficiat de informatii despre GAL Confluente Moldave , fie din materialele informative distribuite, din intalnirile/ evenimentele organizate sau dintr-un mix al acestora, ceea ce este de natura sa concluzionam ca activitatile de animare a teritoriului si-au atins din acest punct de vedere scopul.

## 2 -Ati incercat sa accesati fonduri europene prin GAL Confluente Moldave?


<i>Varianta raspuns/ participanti care nu au raspuns</i>	<i>Nr. respondenti</i>
Sunt beneficiar al unei finantari prin GAL Confluente Moldave	0
Nu am reusit sa solicit fonduri europene din cauza birocratiei obtinerii actelor si documentelor necesare	14
Nu am reusit sa solicit fonduri europene din cauza imposibilitatii obtinerii banilor pentru cofinantare proprie	33
Nu am auzit pâna in prezent de vreo posibilitate de obtinere a fondurilor europene prin GAL Confluente Moldave	9
Altele – precizati	12
Nu au raspuns la aceasta intrebare	9

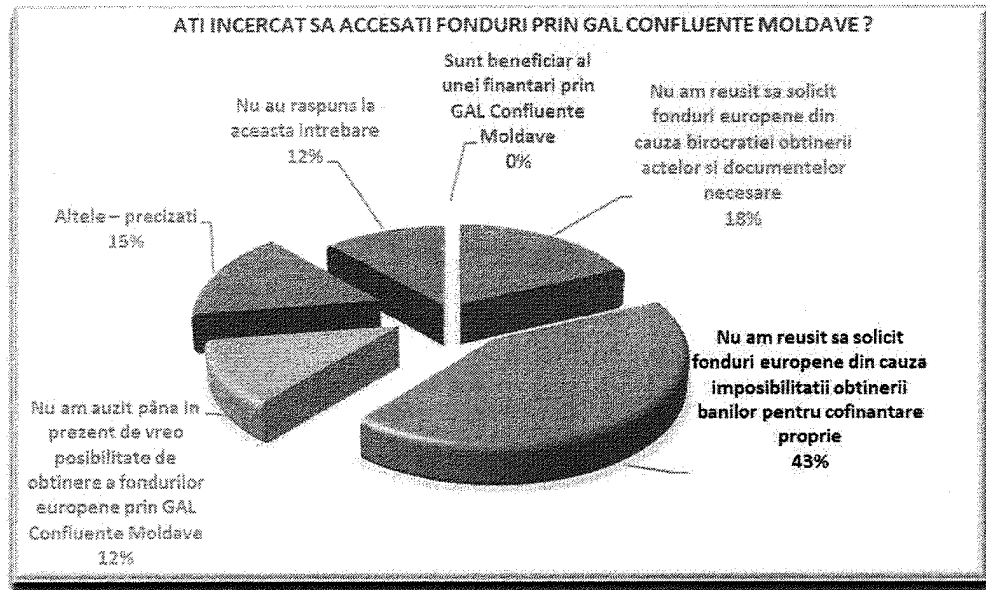

Din analiza raspunsurilor la aceasta intrebare se constata ca peste 60% dintre respondenti considera ca birocratia si asigurarea co-finantarii sunt principalele aspecte care influenteaza negativ decizia lor privind incercarea de a accesa fonduri europene. De aici se poate trage concluzia ca masurile forfetare pentru mediul privat ar fi o solutie pentru un viitor exercitiu financiar in conditiile in care cinci din cele 7 comune au un nivel de dezvoltare umana (IDUL) scazut – Berzunti 48,66, Buhoci 49,65, Cleja 53,12, Faraoani 51,85 si Livezi 53,12.

### 3 -Daca nu, ce conditii credeti ca va lipsesc?

<i>Varianta raspuns/ participanti care nu au raspuns</i>	<i>Nr. respondenti</i>
Nu am suficiente bani sa incep	41
Nu detin o idee clara despre ce as putea face	22
Nu cunosc pe nimeni care sa ma ajute	2
Nu detin un spatiu potrivit	2
Nu detin suficient teren	3
Altele – precizati	0
Nu au raspuns la aceasta intrebare	7



**4 -Daca ati accesat fonduri europene prin GAL Confluente Moldave care sunt problemele importante de care v-ati lovit pe parcursul solicitarii acestora?**


- -Lipsa de profesionalism a societăților de consultanță
- -Asigurarea banilor necesari pentru cofinanțarea proprie
- -Obținerea actelor și documentelor necesare întocmirii proiectului
- -Proceduri complicate pentru accesarea fondurilor europene
- -Altele, precizați

La această întrebare 48,05% dintre respondenți nu au răspuns, iar 51,95 % au dat un răspuns necorelat cu răspunsul la întrebările anterioare, ceea ce dovedește o insuficientă concentrare pentru înțelegerea întrebării.

**5 - Care domenii considerate ca sunt prioritare în localitatea dumneavoastră pentru finanțare prin intermediul GAL Confluente Moldave?**

<i>Varianta raspuns/ participanti care nu au raspuns</i>	<i>Nr. respondenti</i>
Agricol	25
Non agricol	10
Social	6
Dezvoltarea infrastructurii locale de baza	10
Agricol si Social	2
Agricol si Infrastructura de baza	10

Agricol, Non agricol, Social, Infrastructura de baza	3
Agricol, Social, Infrastructura de baza	2
Social si Infrastructura de baza	2
Agricol, Non agricol, Infrastructura de baza	1
Agricol si Non agricol	2
Nu au raspuns	4

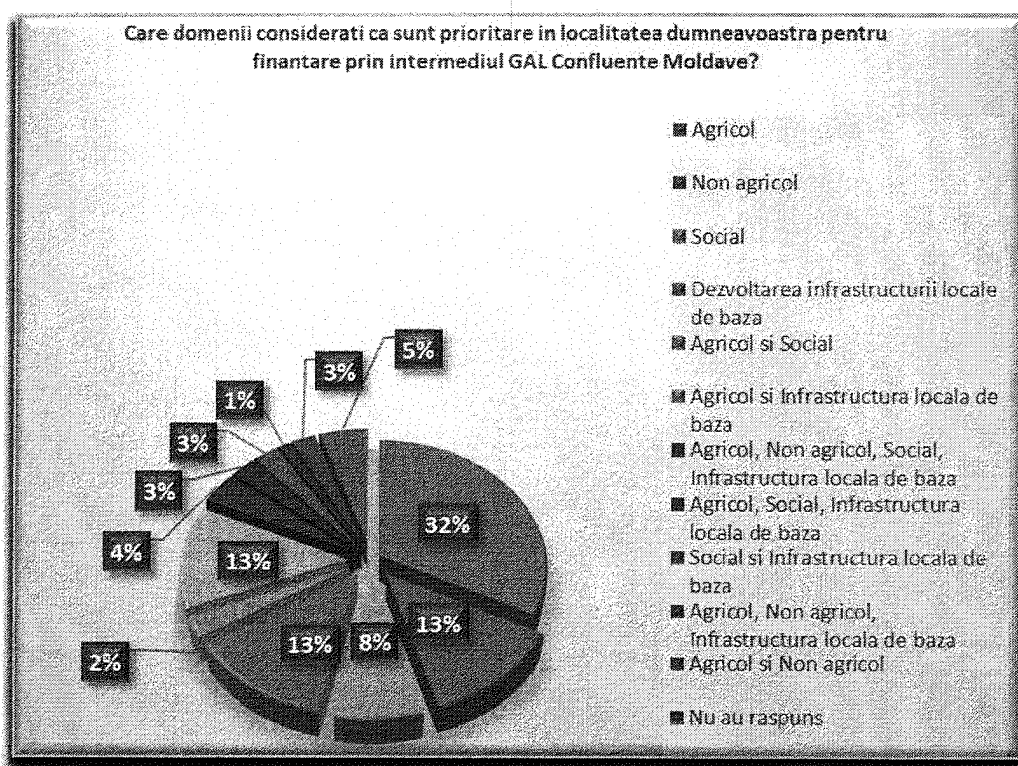

Analizand raspunsurile la aceasta intrebare concluzionam urmatoarele:


- 58% dintre respondenti considera ca domeniul prioritar pentru finantare in localitatea lor este agricultura - dintre care 32% considera prioritar numai domeniul agricol, 2% domeniile agricol si social, 13% domeniile agricol si infrastructura de baza, 4% agricol, non agricol, social si infrastructura locala de baza, 3% agricol, social si infrastructura locala de baza, 1% agricol, non agricol, infrastructura locala de baza si 3% agricol si non agricol;
- 37% dintre respondenti considera ca domeniul prioritar pentru finantare in localitatea lor este infrastructura locala de baza – dintre care 13% considera prioritar numai acest domeniu, 13% considera prioritar domeniile agricol si infrastructura locala de baza, 4% agricol, non agricol, social si infrastructura locala de baza, 3% agricol, social si

infrastructura locala de baza, 1% agricol, non agricol, infrastructura locala de baza si 3% social si infrastructura locala de baza;

- 20% dintre respondenti considera ca domeniul prioritar pentru finantare in localitatea lor este cel social – dintre care 8% considera prioritar numai acest domeniu, 2% condidera prioritare domeniile agricol si social, 4% agricol, non agricol, social si infrastructura locala de baza, 3% agricol, social si infrastructura locala de baza si si 3% social si infrastructura locala de baza.

#### 6 - Daca ati dori sa incepeti o afacere proprie in ce tip de activitate ati investi ?

<i>Varianta raspuns/ participanti care nu au raspuns</i>	<i>Nr. respondenti</i>
Activitati agricole	32
Activitati non agricole	17
Prestari servicii	21
Activitati agricole si Prestari servicii	1
Activitati agricole si Activitati non agricole	1
Altele – precizati	5






MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Din punctul de vedere al opțiunilor de investiții 44% dintre respondenți au optat pentru activități agricole (dintre care 42% numai activități agricole) 23% pentru activități non agricole (dintre care 22% numai activități non agricole) și 28% servicii (dintre care 27% numai servicii), ceea ce putem considera ca se corelează cu răspunsurile la întrebarea 5 privitoare la domeniile considerate prioritare pentru a fi finanțate prin GAL.

**7- Care credeți că sunt principalele motive pentru care dumneavoastră, chiar dacă v-ați gândit să începeți o afacere proprie (sau deja ea există), nu ați întreprins nimic până acum pentru accesarea unei finanțări europene prin GAL Confluente Moldave?**


<i>Varianta raspuns/ participanti care nu au raspuns</i>	<i>Nr. respondenti</i>
Procentul de cofinanțare prea ridicat în cadrul măsurilor finanțare	13
Sprijinul nerambursabil pe proiect prea mic	11
Nu cunosc pe nimeni care să mă ajute în elaborarea unei cereri de finanțare	15
Proceduri greoaie de accesare a fondurilor europene	22
Altele – precizați	
Nu au răspuns	11
Procentul de cofinanțare prea ridicat în cadrul măsurilor finanțare și Sprijinul nerambursabil pe proiect prea mic	2
Procentul de cofinanțare prea ridicat în cadrul măsurilor finanțare și Proceduri greoaie de accesare a fondurilor europene	3

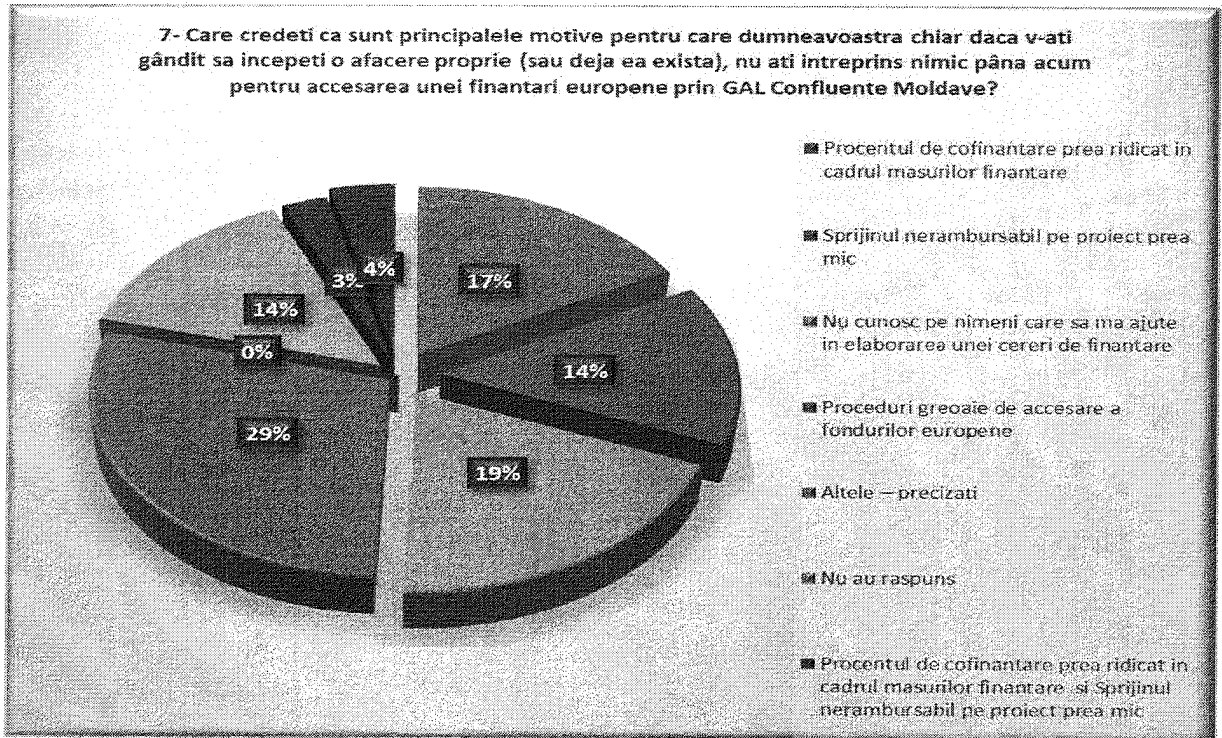

**8- Considerați că în localitatea dumneavoastră există condiții și piața pentru produsele sau serviciile pentru care ați fi dispusi să investiți?**

<i>Varianta raspuns/ participanti care nu au raspuns</i>	<i>Nr. respondenti</i>
Da	47
Nu	9
Nu stiu	15
Nu au raspuns	6






Din raspunsurile la aceasta intrebare se poate concluziona:

- -procentul de 61% a raspunsurilor afirmative
- -corelarea cu raspunsurile la intrebarea 6 "Daca ati dori sa incepeti o afacere proprie in ce tip de activitate ati investiti?" dovedeste existenta interesului respondentilor pentru investitii in localitatea lor.

9- Cum apreciati interactiunea cu echipa tehnica GAL Confluente Moldave din punctul de vedere al furnizarii informațiilor necesare și /sau al evaluarii proiectelor?

<i>Varianta raspuns/ participanti care nu au raspuns</i>	<i>Nr. respondenti</i>
Excelenta	30
Buna	36
Satisfacatoare	5
Proasta	0
Nu am interactionat cu angajatii GAL	2
NU au raspuns	4



Raspunsurile la aceasta intrebare evidentiaza faptul ca echipa tehnica a GAL Confluente Moldave are expertiza necesara furnizarii informatiilor necesare solicitantilor, precum si publicului larg in cadrul activitatilor de animare a teritoriului desfasurate in cadrul SDL.


### 3.2.1 - Analiza chestionare adresate Adminstratiilor Publice Locale din cadrul GAL Confluente Moldave

La chestionarele adresate Adminstratiilor Publice Locale din cadrul GAL Confluente Moldave au raspuns 6 din cele 7 comune.

Prezentam in continuare analiza si concluziile rezultate pentru cele opt intrebari din chestionarele aplicate administratiilor publice locale.

#### 1. Dupa parerea dumneavoastra nevoile de la momentul elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Confluente Moldave au ramas aceleasi ca in momentul elaborarii acesteia?


Varianta raspuns	Nr. respondenti
In mica masura	3
In medie masura	1
In mare masura	2

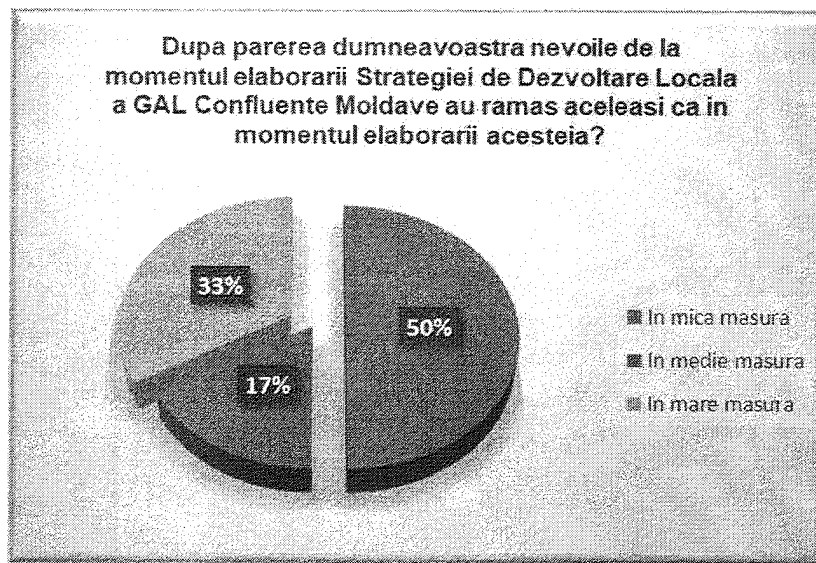

Din analiza rezultatelor la aceasta intrebare doar 33% dintre respondenti considera ca nevoile identificate la momentul elaborarii SDL sunt inca valabile, ceea ce presupune o analiza mai detaliata pentru identificarea acelor aspecte punctuale care nu mai corespund, pentru a putea opera ajustarile care se impun pentru viitoarea perioada de programare, respectiv viitorul exercitiu financiar.

**2. Dupa parerea dumneavoastra activitatile (masurile) prevazute in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala si resursele alocate acestora sunt suficiente pentru a genera realizarile si rezultatele asteptate (indicatorii prevazuti in strategie)?**


<i>Varianta raspuns</i>	<i>Nr. respondenti</i>
In mica masura	2
In medie masura	2
In mare masura	2

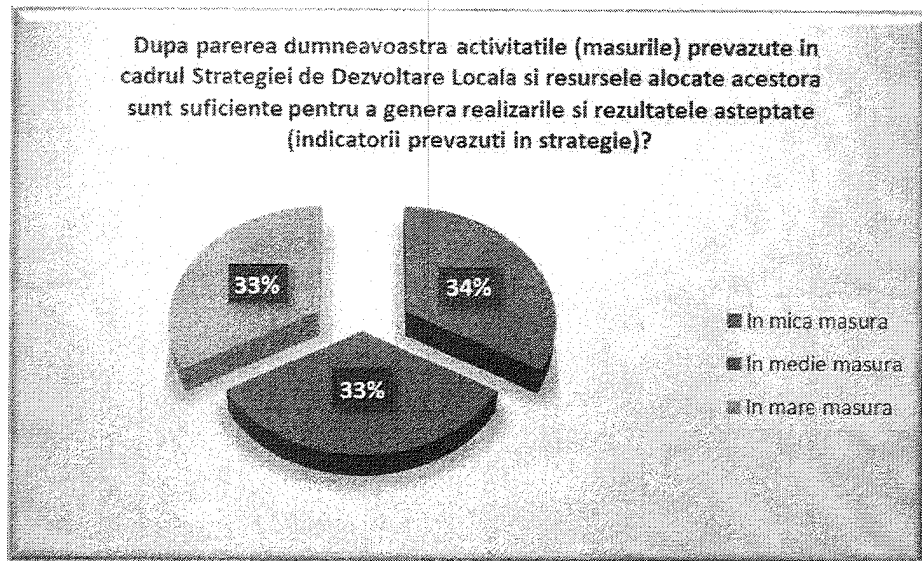

Raspunsul la aceasta intrebare releva faptul ca doar 33% dintre respondenti considera intr-o mare masura ca masurile si fondurile alocate in cadrul SDL sunt suficiente sa genereze rezultatele asteptate, ceea ce presupune o ajustare a acestora intr-o viitoare etapa de programare, respectiv viitorul exercitiu financiar dupa o consultare serioasa si o analiza atenta tuturor segmentelor comunitatilor locale – societata civila, mediul de afaceri si administratia publica, precum si a situatiei reale din teritoriul GAL Confluente Moldave.

**3. Dupa parerea dumneavoastra indicatorii de monitorizare sunt adecvati pentru a oferi o imagine clara asupra realizărilor (specifci, masurabili, fezabili, relevanti si suficieni)?**


<i>Varianta raspuns</i>	<i>Nr. respondenti</i>
In mica masura	2
In medie masura	2
In mare masura	2

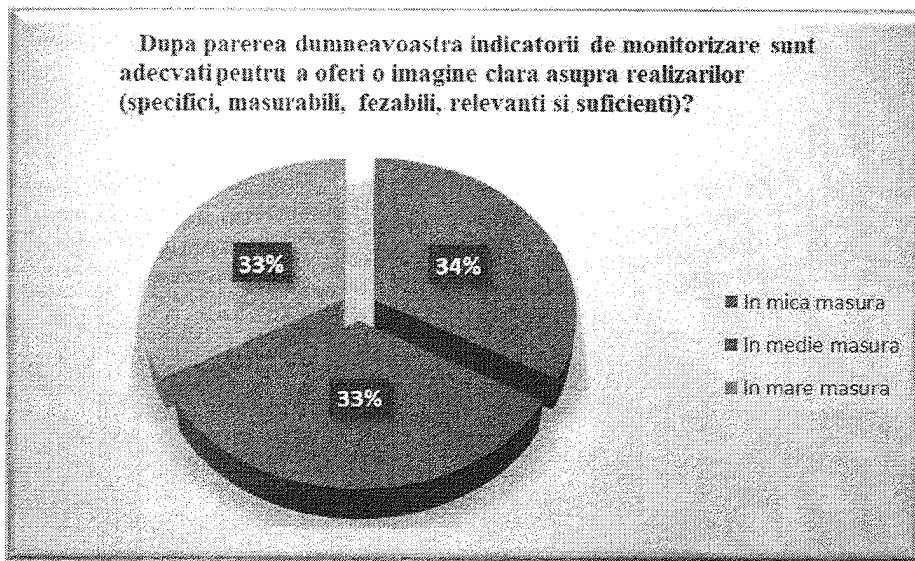

Raspunsul la aceasta intrebare releva faptul ca 33% dintre respondenti considera ca intr-o mare masura indicatorii de monitorizare sunt adecvati pentru a oferi o imagine clara asupra realizarilor (specifci, masurabili, fezabili, relevanti si suficieni), iar 33% intr-o medie masura, ceea ce presupune o analiza a identificarii si definirii acestora in viitoarea etapa de programare, respectiv viitorul exercitiu financiar.

**4. Dupa parerea dumneavoastra rezultatele asteptate sunt clar definite?**


Varianta raspuns	Nr. respondenti
In mica masura	2
In medie masura	4
In mare masura	0

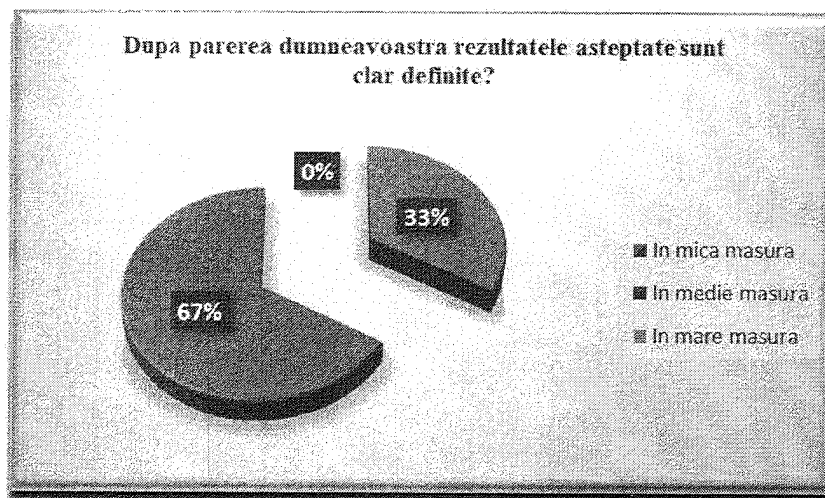

Raspunsul la aceasta intrebare releva faptul ca 67% dintre respondenti considera ca rezultatele asteptate sunt clar definite doar in medie masura, ceea ce presupune o redefinire a acestora intr-o viitoare etapa de programare.

**5. Care este perceptia dumneavoastra privind gradul de imbunatatire a capitalului social local prin aplicarea metodei Leader (exp. schimbarea mentalitatilor, cresterea colaborarii si increderii reciproce si fata de GAL, dezvoltarea de competente si capacitati, dezvoltarea unor retele)?**


<i>Varianta raspuns</i>	<i>Nr. respondenti</i>
Nici o imbunatatire	0
Imbunatatire medie	6
Imbunatatire mare	0

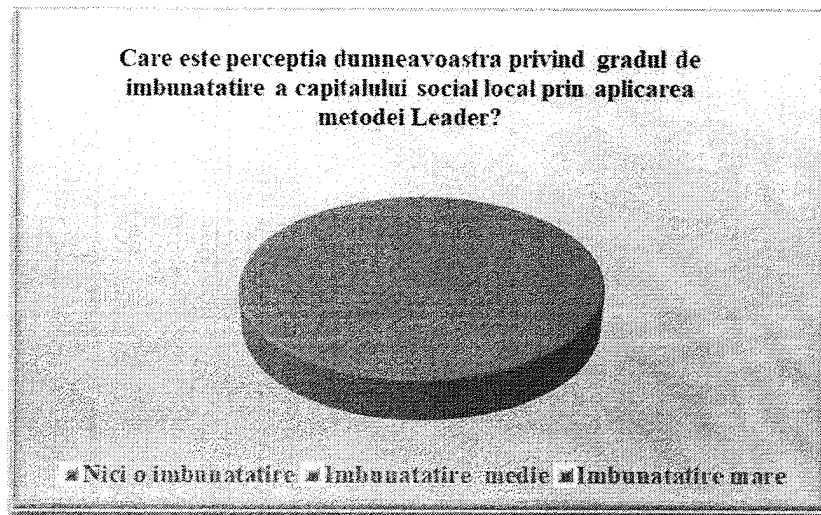

La aceasta intrebare 100% dintre respondenti au considerat ca doar intr-o masura medie a fost inregistrata o imbunatatire a capitalului social local prin aplicarea metodei Leader (exp. schimbarea mentalitatilor, cresterea colaborarii si increderii reciproce si fata de GAL, dezvoltarea de competente si capacitati, dezvoltarea unor retele), ceea ce presupune intensificarea colaborarii dintre APL-uri si GAL atat in etapa de programare a SDL cat si in cea de implementare.

**6. Care este perceptia dumneavoastra privind gradul de imbunatatire a guvernantei locale (de exemplu imbunatatirea gestionarii functiilor administrative pe plan local, implicare sporita a comunitatii si a factorilor interesati in luarea deciziilor, cresterea rolului GAL in guvernanta pe diferite niveluri, cresterea capacitatii de a gestiona fonduri publice-private etc.) prin aplicarea metodei Leader?**


<i>Varianta raspuns</i>	<i>Nr. respondenti</i>
Nici o imbunatatire	0
Imbunatatire medie	6
Imbunatatire mare	0

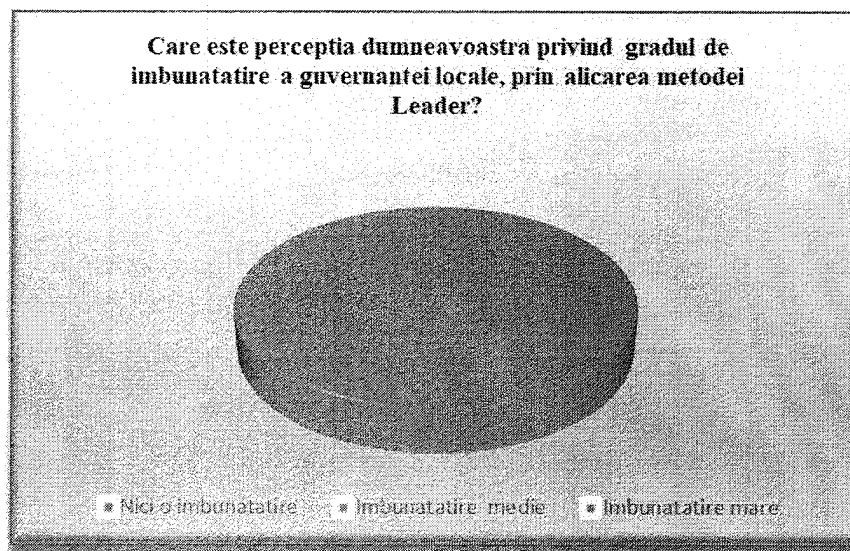

La aceasta intrebare 100% dintre respondenti au considerat ca doar intr-o masura medie a fost inregistrata o imbunatatire a capitalului social local prin aplicarea metodei Leader (exp. schimbarea mentalitatilor, cresterea colaborarii si increderii reciproce si fata de GAL, dezvoltarea de competente si capacitati, dezvoltarea unor retele), ceea ce presupune intensificarea colaborarii dintre APL-uri si GAL atat in etapa de programare a SDL cat si in cea de implementare.

**7. Dupa parerea dumneavoastră rezultatele implementării SDL sunt de natura sa genereze imbunatatirea calitatii vietii in teritoriul GAL (exp. crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii de baza) ?**

<i>Varianta raspuns</i>	<i>Nr. respondenti</i>
Nici o imbunatatire	1
Imbunatatire medie	5
Imbunatatire mare	0

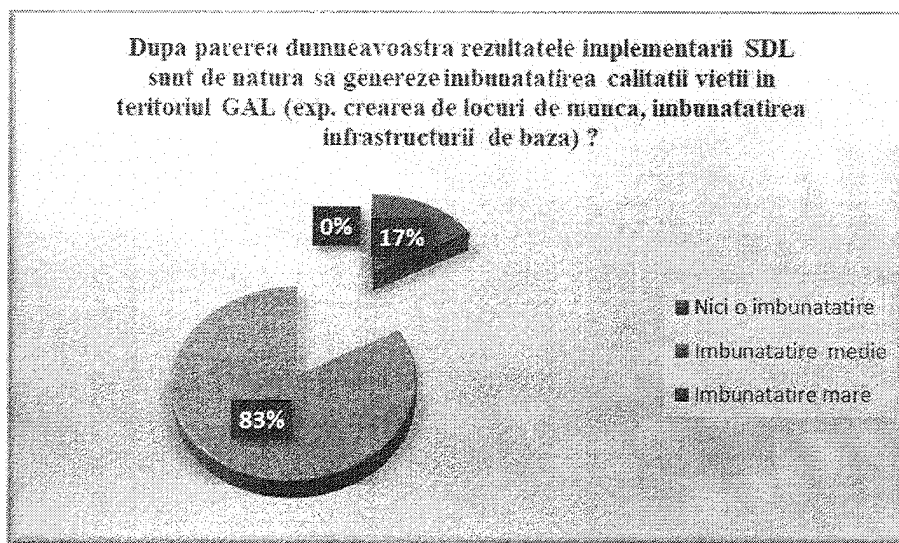

La aceasta intrebare 83% dintre respondenti au considerat ca doar intr-o masura medie rezultatele implementarii SDL sunt de natura sa genereze imbunatatirea calitatii vietii in teritoriul GAL (exp. crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii de baza), ceea ce presupune o mai mare atentie in elaborarea viitorului SDL, precum si a masurilor propuse spre finantare. **Care sunt problemele cu care v-ati confruntat in vederea accesarii de fonduri europene prin GAL Confluente Moldave si ce masuri de imbunatatire propuneti pentru solutionarea acestora in viitor?**

La aceasta intrebare cei mai multi dintre respondenti identifica probleme in ceea ce priveste legea achizitiilor publice, urmata de modificari ale regulilor in timpul implementarii proiectelor, concluzia fiind aceea de a acorda mai multa atentie acestor aspecte de catre entitatile implicate in elaborarea documentelor legale aferente achizitiilor publice, precum si a celor care definesc regulile de implementare.

### 3.3. CONCLUZII

Putem concluziona ca pentru perioada acoperita de evaluare nu se poate inca trage o concluzie finala privitoare la implemetarea sub toate aspectele a SDL:

- Logica interventiei,
- Contribuita oparatiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevazute de strategie,
- Valoarea adaugata a metodei LEADER,
- Contribuita SDL la aria de interventie 6B.

Fiind la primul sau exercitiu financiar GAL Confluente Moldave parcurge in prezent etapa de coagulare a cooperarii la nivelul membrilor fondatori ai acestuia, precum si intre acestia si fermierii/agentii economici de pe teritoriul GAL. In principiu pentru viitorul exercitiu financiar este necesara o mobilizare mai mare la nivel local, implicarea mai activa a diferitilor actori locali, precum si o sporire a interactiunii dintre acestia - institutii publice, ONG-uri, mediul de afaceri etc.
